

id		Nombre de tarea	Duración				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	
1		EL CABRIL	109 días									
2		DEMOLICIONES	109 días									
3		DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE	8 días									
4		DEMOLICIÓN ALICATADO MANUAL (plaqueta + mortero)	5 días									
5		LEVANTADO PAVIM. BALDOSA CERÁMICA A MANO	8 días									
6		LIMPIEZA RELLENO S/FORJADO	8 días									
7		LEVANT. APAR. SANIT. I/INSTALACIÓN	2 días									
8		LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES	2 días									
9		RETIRADA MOBILIARIO DE SALON	2 días									
10		APERTURA DE HUECO PARA NUEVO ACCESO	10 días									
11		APERTURA DE HUECO PARA NUEVA VENTANA 40X125	10 días									
12		AMPLIACION DE HUECO DE PAZO ZONA EXPO. 1 A ZONA EXPO. 2	10 días									
13		DEMOLICIÓN FALSO TECHO ESCAYOLA	10 días									
14		LEVANTADO TARIMA DE MADERA A MANO	10 días									
15		DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO	5 días									
16		DEMOLICION DE INSTALACION ELÉCTRICA	13 días									
17		APERTURA DE HUECO EN SOLERA O FORJADO PARA NUEVO SANEAMIENTO	5 días									
18		APERTURA DE HUECO EN SOLERA PARA ALOJAR UP LIGHT	9 días									
19		CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 m³	109 días									
20		ALBAÑILERIA	65 días									
21		TABIQUE KNAUF W112 150/600 (2*15+90+2*15) C/AISLAM.	10 días									
22		RECRECIDO 8/9 cm PLASTÓN	10 días									
23		CEGADO PARCIAL DE HUECO DE PUERTA	5 días									
24		CEGADO DE HORNACINAS EXISTENTES (ELEMENTOS DE A.A. RETIRADOS)	2 días									
25		SOPORTE DE PANTALLA EN SALON DE ACTOS FORMADA POR TABIQUE KNAUF	5 días									
26		AYUDAS ALBAÑILERIA	55 días									
27		PREPARACION DE PARAMENTOS EN ZONAS DONDE SE SUBE TECHO	10 días									
28		REPARACION DE SOLADO EN ZONA DE ENTRADA (UP LIGHT)	15 días									
29		REVESTIMIENTOS	75 días									
30		ALICATADO PLAQUETA GRES (BALDOSA 20 €/m²) (cem.cola)	15 días									
31		SOLADO DE GRES (20 €/m²) INTERIOR C 3 (cemento cola)	8 días									
32		PAV. AUTONIVELANTE CON TRÁNSITO MEDIO	10 días									
33		PAVIMENTO VINÍLICO TARKET TX ESSENTIAL	15 días									
34		TECHO CONTINUO PLADURFON R12/25	10 días									
35		FALSO TECHO ROCKFON BOXER 1200x600x20	10 días									
36		PAVIMENTO VINÍLICO TARKET TX ESSENTIAL EN SALON DE ACTOS	15 días									
37		PLATAFORMA DE MADERA PARA TARIMA ELEVADA	5 días									
38		REVESTIMIENTO SALON ACTOS MICROACUSTIC 8X2 IGNIFUGO	10 días									
39		CARPINTERIA DE MADERA	65 días									
40		PUERTA PASO LISA PINTADA HOJA 62	5 días									
41		PUERTA PASO LISA PINTADA HOJA 82	5 días									
42		PUERTA PASO DOBLE HOJA 82 + 42	5 días									
43		PUERTA CORREDERA LISA LACADA 130 X 230	5 días									
44		PUERTA DE ARMARIO HOJA 62	5 días									
45		ARM. METÁL. PTA. CORRED. 1HOJA 130 cm	2 días									
46		FRENTE DE ARMARIO 2 HOJAS 60 CM	5 días									
47		CARPINTERIA METALICA	25 días									
48		VENTANA PVC 2 HOJAS OSCILOBATIENTES + FIJO	5 días									
49		VENTANA PVC 1 HOJA OSCILOBATIENTE	5 días									
50		RODAPIE DE ACERO GALVANIZADO	20 días									
51		PASAMANOS TUBO D= 40 mmn ACERO CROMADO MATE	5 días									
52		VIDRIERIA	10 días									
53		DOBLE PUERTA SECURIT INCOLORO 2190x896 ACCESO PV1	5 días									
54		CLIMALIT 6/ 10,12,16/ 6 mm	5 días									
55		VIDRIO SEGURIDAD STADIP 66.1 INCOLORO (282)	5 días									

Proyecto: El Cabril

Tarea

División

Hito

.....

◆

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

◆

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Progreso


◆

↓

Progreso manual

Página 1

id		Nombre de tarea	Duración																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
----	--	-----------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

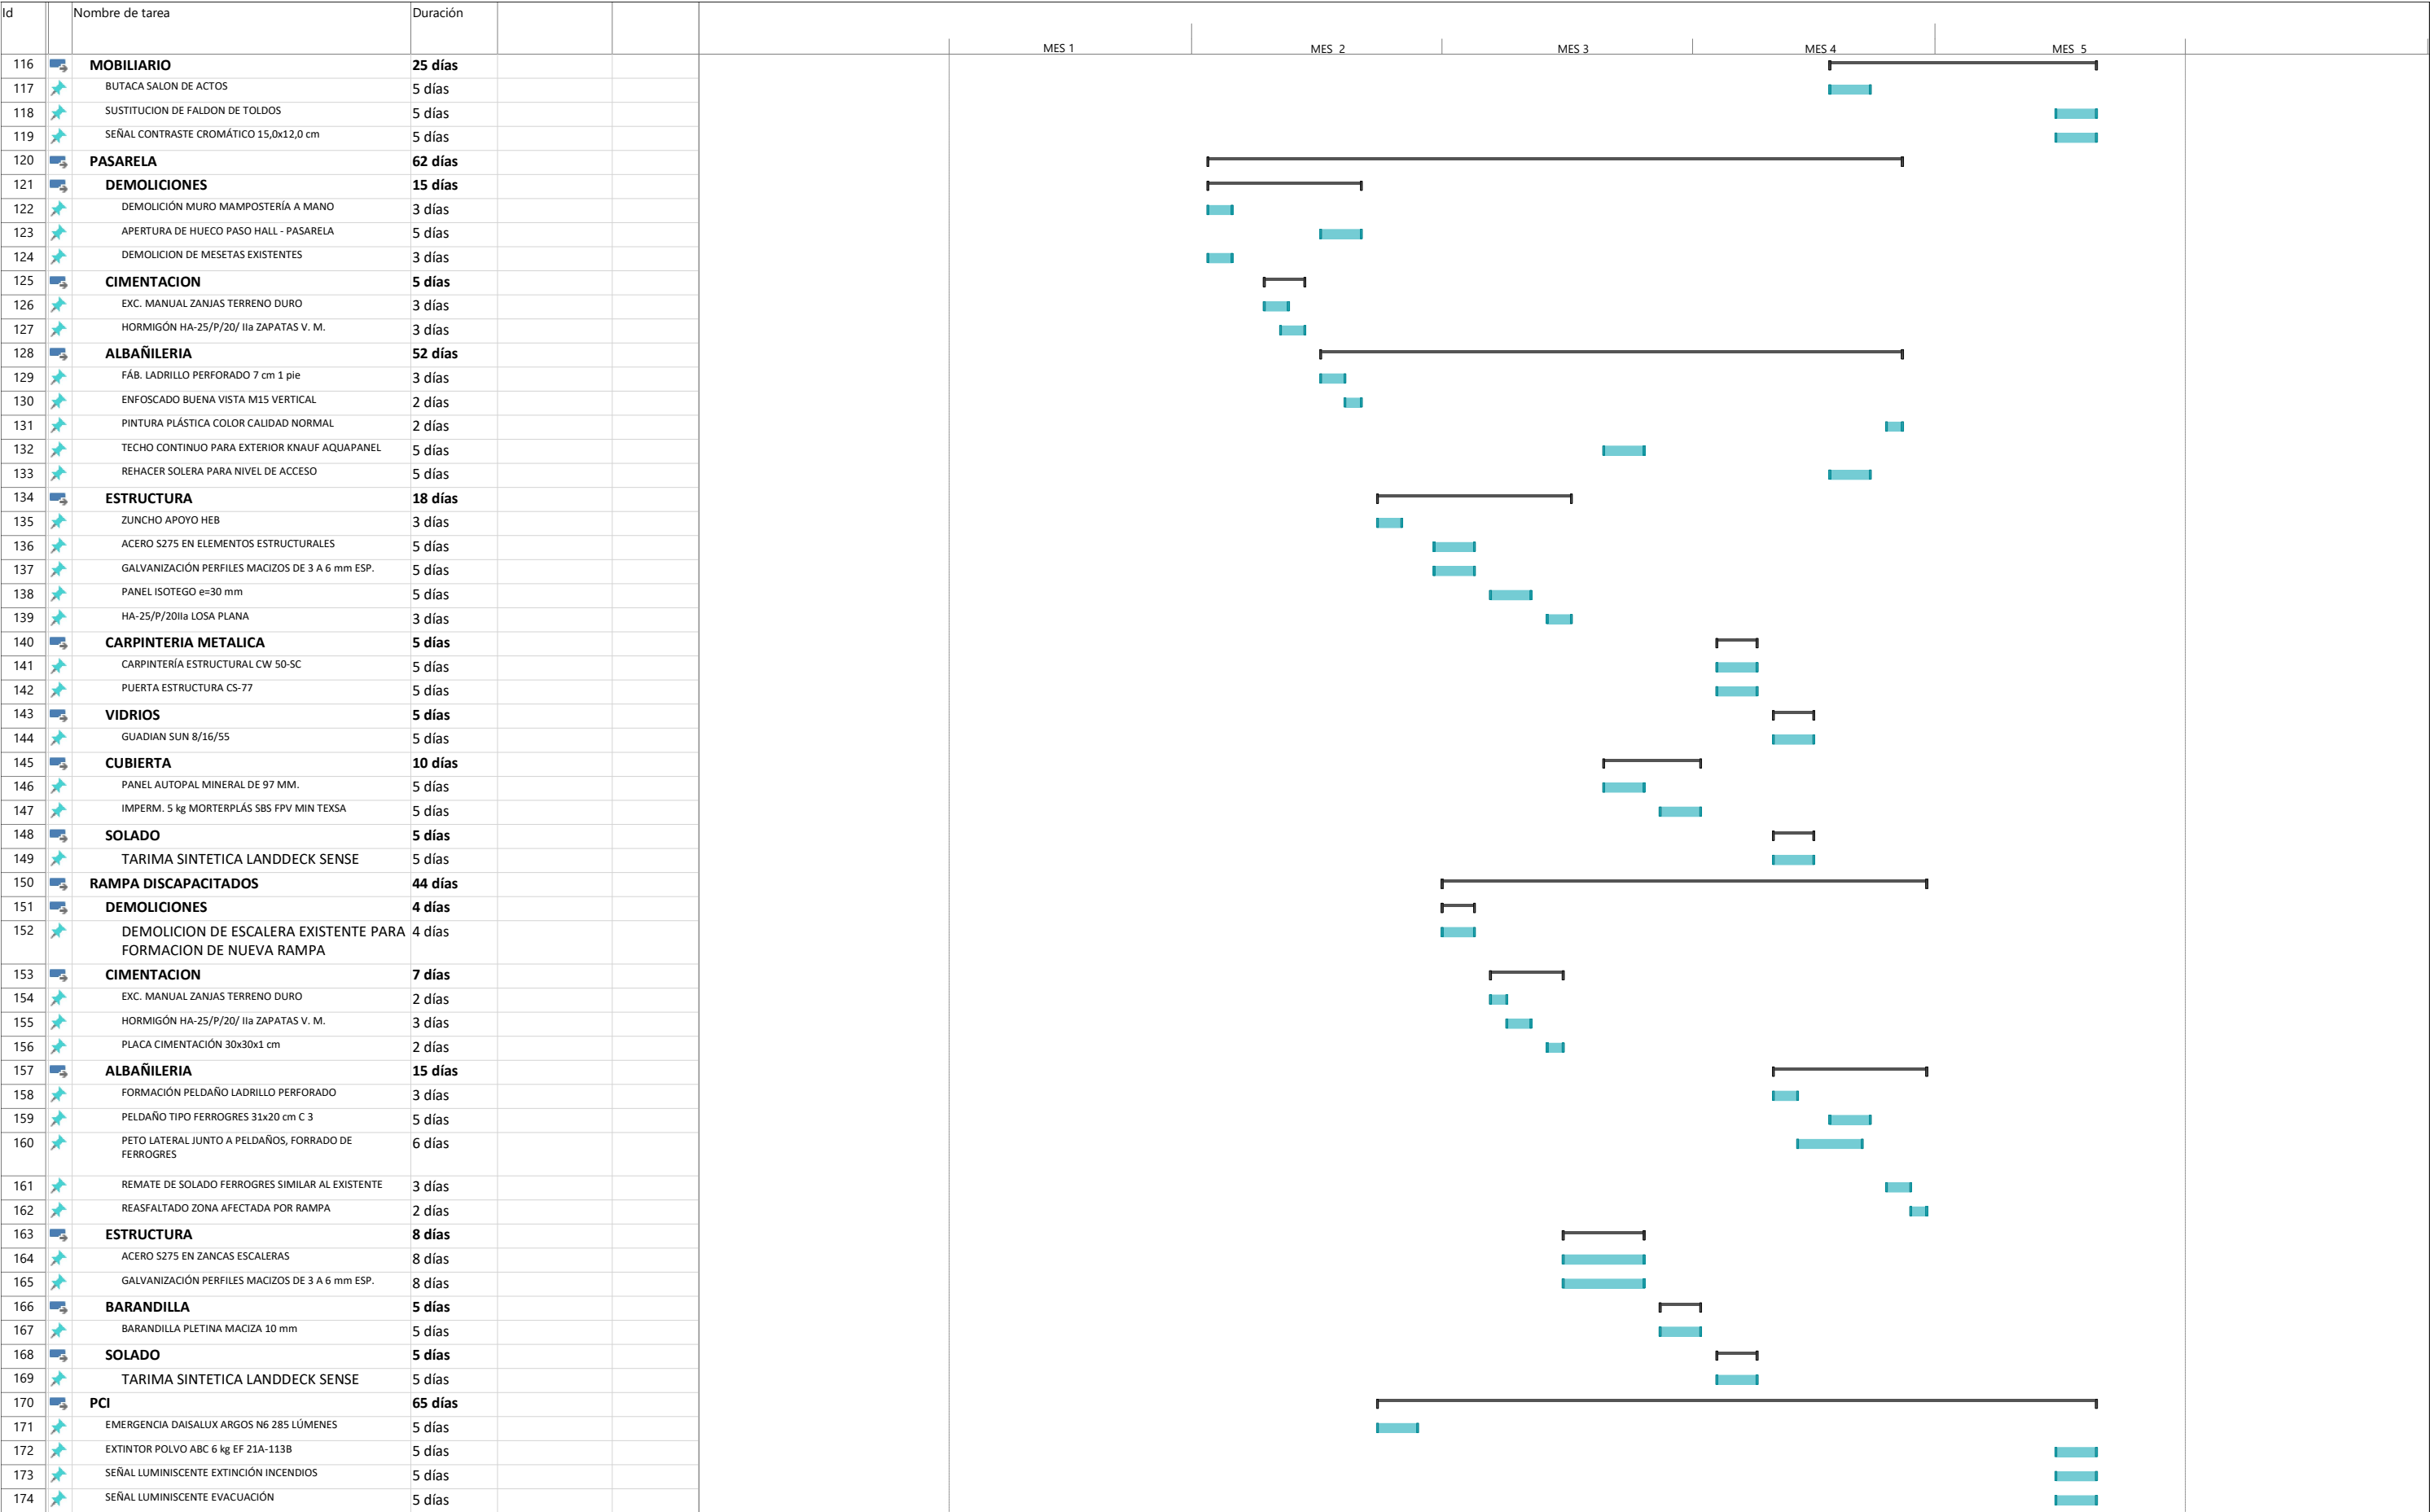

Proyecto: El Cabril

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
